

De MS Project a un Dashboard Interactivo en Power BI

Control de Tareas, Curva S y Procura [Paso a Paso]



08/06/2026

Fase


01 - Fase 1	02 - Fase 2	03 - Fase 3	04 - Fase 4	05 - Fase 5	06 - Fase 6
07 - Fase 7	08 - Fase 8	09 - Fase 9	10 - Fase 10	11 - Fase 11	12 - Fase 12

EDT	Nombre de tarea	CATEGORIA	FASE	Comienzo	Fin	Total Horas Plan	Total Horas Real	Desviación de Horas
1.12.1	Construcción de Garita de Acceso	Exteriores	Fase 12	05/06/2026	15/06/2026	112	26	86
1.12.2	Pavimentación de Vía de Acceso	Exteriores	Fase 12	12/06/2026	22/06/2026	112	0	112
1.12.3	Alumbrado Público de Vía	Exteriores	Fase 12	20/06/2026	27/06/2026	112	0	112
1.12.4	Cercado Perimetral Concertina	Exteriores	Fase 12	25/06/2026	30/06/2026	64	0	64
1.12.5	Pintura de Demarcación Vial	Exteriores	Fase 12	29/06/2026	02/07/2026	64	0	64
Total						464	26	438

FECHA DE ACTULIZACION

08/06/2026

% Real, y % Plan

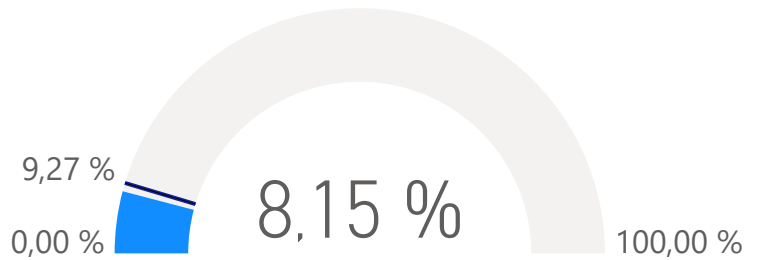

DESVIACION REAL -PLAN


-1,12 %

Orden_Fase


- ☐ 01 - Fase 1
- ☐ 02 - Fase 2
- ☐ 03 - Fase 3
- ☐ 04 - Fase 4

EDT	Nombre de tarea
1.1.1	Excavación y Obras Civiles
1.1.2	Cimentación de Estructuras
1.1.3	Montaje de Columnas Metálicas
1.1.4	Instalación de Techo y Cobertura
1.1.5	Canalización de Aguas de Lluvia
1.2.1	Tendido de Tuberías Subterráneas

Horas Plan Acumuladas y Horas Real Acumuladas por Date

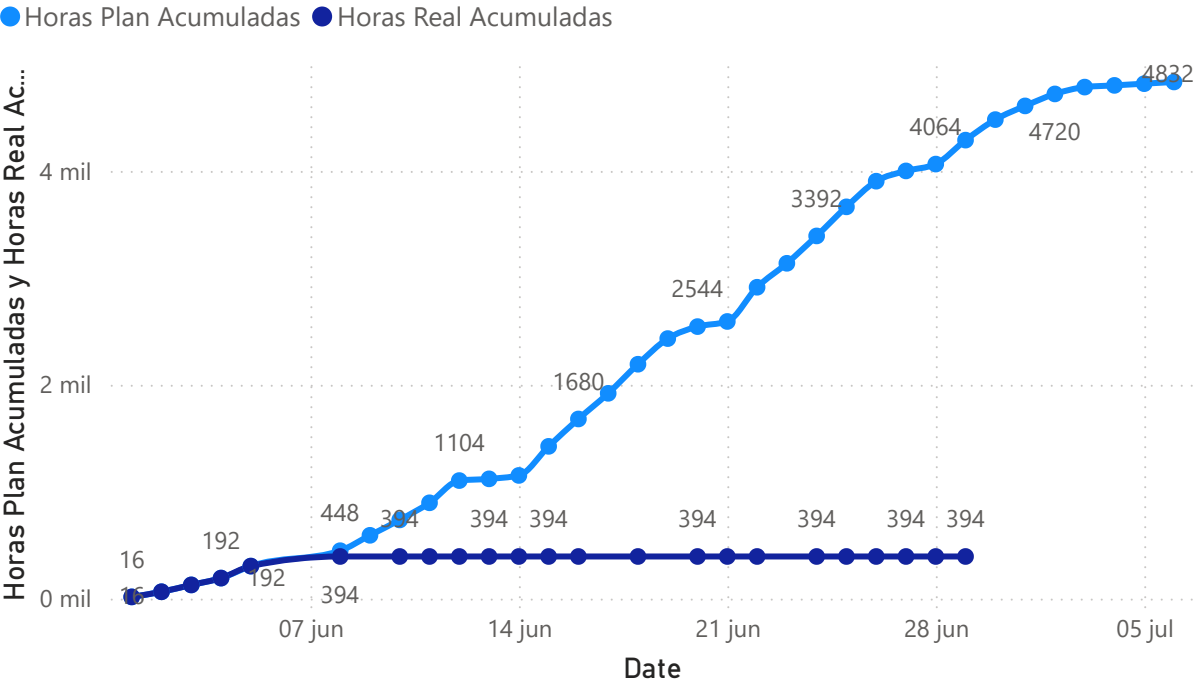

% Plan Acumulado, % Real Acumulado y Desviacion_Avance

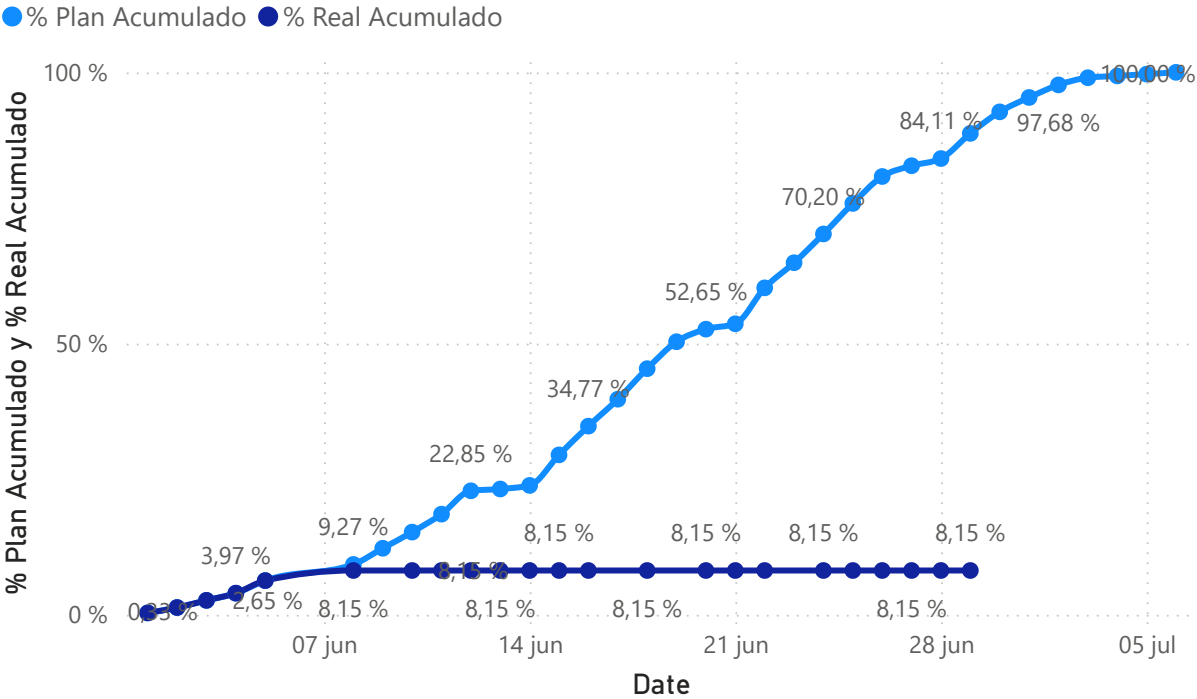

Orden_Fase

01 - Fase 1

▼

FECHA DE ACTULIZACION

08/06/2026

Nombre de tarea	ID_Compra	Nombre_Producto	Fecha_Compra	Fecha_Inicio_Tarea	Estado_Procura	Suma de Monto_Total (\$)
☐ Canalización de Aguas de Lluvia	☐ C-43	☐ Canaleta PVC Lluvia	☐ lunes, 15 de junio de 2026	☐ 26/06/2026	🟢 A TIEMPO (11 días antes)	180
☐ Canalización de Aguas de Lluvia	☐ C-44	☐ Canaleta PVC Lluvia	☐ domingo, 28 de junio de 2026	☐ 26/06/2026	🔴 RETRASADO (Llegó 2 días tarde)	360
☐ Cimentación de Estructuras	☐ C-18	☐ Cemento Portland (Saco)	☐ lunes, 01 de junio de 2026	☐ 08/06/2026	🟢 A TIEMPO (7 días antes)	255
☐ Cimentación de Estructuras	☐ C-19	☐ Cemento Portland (Saco)	☐ martes, 09 de junio de 2026	☐ 08/06/2026	🔴 RETRASADO (Llegó 1 días tarde)	425
☐ Cimentación de Estructuras	☐ C-21	☐ Acero Corrugado 1/2"	☐ lunes, 25 de mayo de 2026	☐ 08/06/2026	🟢 A TIEMPO (14 días antes)	4000
☐ Cimentación de Estructuras	☐ C-37	☐ Piedra Picada 3/4" (\$m^3\$)	☐ sábado, 30 de mayo de 2026	☐ 08/06/2026	🟢 A TIEMPO (9 días antes)	640
☐ Cimentación de Estructuras	☐ C-53	☐ Cemento Portland (Saco)	☐ domingo, 07 de junio de 2026	☐ 08/06/2026	🟢 A TIEMPO (1 días antes)	2125
☐ Cimentación de Estructuras	☐ C-54	☐ Acero Corrugado 1/2"	☐ jueves, 28 de mayo de 2026	☐ 08/06/2026	🟢 A TIEMPO (11 días antes)	2000
☐ Excavación y Obras Civiles	☐ C-35	☐ Arena Cernida (\$m^3\$)	☐ jueves, 28 de mayo de 2026	☐ 01/06/2026	🟢 A TIEMPO (4 días antes)	330
☐ Montaje de Columnas Metálicas	☐ C-25	☐ Pernos de Anclaje 3/4"	☐ martes, 02 de junio de 2026	☐ 15/06/2026	🟢 A TIEMPO (13 días antes)	330
☐ Montaje de Columnas Metálicas	☐ C-39	☐ Viga Doble T (IPN 160)	☐ miércoles, 10 de junio de 2026	☐ 15/06/2026	🟢 A TIEMPO (5 días antes)	1400
☐ Montaje de Columnas Metálicas	☐ C-56	☐ Pernos de Anclaje 3/4"	☐ viernes, 05 de junio de 2026	☐ 15/06/2026	🟢 A TIEMPO (10 días antes)	275

2

Cant_Compras_Justo_A_Tiempo

37

Cant_Compras_Adelantadas

21

Cant_Compras_Retrasadas


60

Total_Compras_Con_Fecha

Cant_Compras_Adelantadas, Cant_Compras_Justo_A_Tiempo y Cant_Compras_Retrasadas

FECHA DE ACTULIZACION

08/06/2026

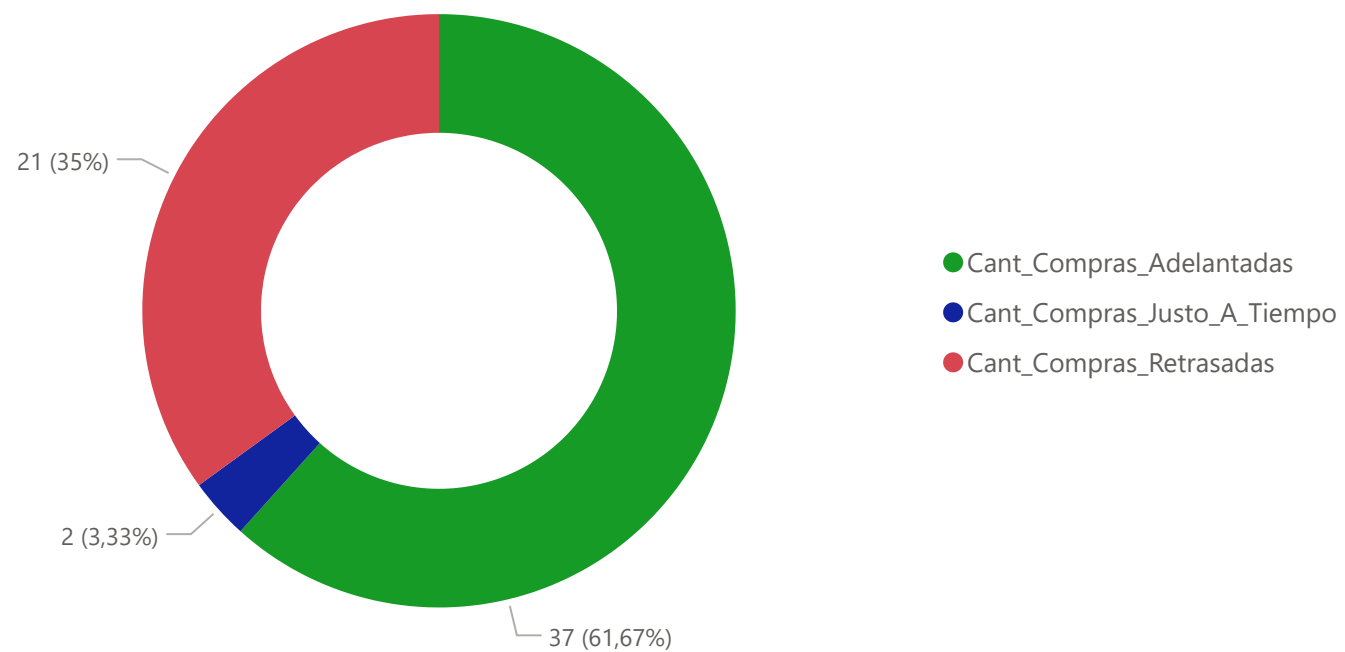

IDTAREA	Nombre de tarea	AnoMes % Avance Tarea Columna	2026-JUNIO					2026-JULIO	
			01/06 al 07/06	08/06 al 14/06	15/06 al 21/06	22/06 al 28/06	29/06 al 05/07	06/07 al 12/07	29/06 al 05/07
☐	T-01	☐ Excavación y Obras Civiles	51,14 %						
☐	T-02	☐ Cimentación de Estructuras	5,68 %						
☐	T-03	☐ Montaje de Columnas Metálicas	0,00 %						
☐	T-04	☐ Instalación de Techo y Cobertura	0,00 %						
☐	T-05	☐ Canalización de Aguas de Lluvia	0,00 %						
☐	T-06	☐ Tendido de Tuberías Subterráneas	35,58 %						
☐	T-07	☐ Conexión de Red de Presión	0,00 %						
☐	T-08	☐ Soldadura de Bridas y Accesorios	0,00 %						
☐	T-09	☐ Montaje de Válvulas de Seccionamiento	0,00 %						
☐	T-10	☐ Pruebas Hidrostáticas de Tuberías	0,00 %						
☐	T-11	☐ Canalización Eléctrica de Paredes	27,08 %						
☐	T-12	☐ Cableado de Fuerza y Control	0,00 %						
☐	T-13	☐ Instalación de Tablero General	0,00 %						
☐	T-14	☐ Montaje de Transformador de Patio	0,00 %						
☐	T-15	☐ Pruebas de Aislamiento y Megado	0,00 %						
☐	T-16	☐ Preparación de Superficies de Concreto	0,00 %						
☐	T-17	☐ Aplicación de Pintura Epóxica en Pisos	0,00 %						
☐	T-18	☐ Sellado de Juntas y Ventanales	0,00 %						
☐	T-19	☐ Acabados de Fachada y Herrería	0,00 %						
☐	T-20	☐ Limpieza General y Entrega de Obra	0,00 %						
☐	T-21	☐ Reparación de Red de Agua	0,00 %						
☐	T-22	☐ Cambio de Válvulas de Vapor	0,00 %						
☐	T-23	☐ Recableado de Oficinas	40,63 %						
☐	T-24	☐ Pintura de Oficinas Administrativas	0,00 %						
☐	T-25	☐ Refuerzo de Soportería Civil	0,00 %						
☐	T-26	☐ Excavación Bloque B	0,00 %						
☐	T-27	☐ Encofrado de Columnas Bloque B	0,00 %						
☐	T-28	☐ Vaciado de Concreto de Columnas	0,00 %						
☐	T-29	☐ Montaje Estructural de Techo	0,00 %						
☐	T-30	☐ Canalizaciones de Servicio	0,00 %						
☐	T-31	☐ Obras Civiles de Fosa de Aceite	77,08 %						
☐	T-32	☐ Montaje de Pórtico de Entrada	10,42 %						
☐	T-33	☐ Tendido de Red de Tierra	0,00 %						
☐	T-34	☐ Conexionado de Tableros Celdas	0,00 %						
☐	T-35	☐ Puestas en Servicio de Equipos	0,00 %						
☐	T-36	☐ Tendido de Fibra Óptica	0,00 %						
☐	T-37	☐ Configuración de Racks	0,00 %						
☐	T-38	☐ Montaie de Cámaras de Viailancia	0.00 %						

FECHA DE ACTULIZACION

08/06/2026

FASE

Todas

% Real, y % Plan

